


## Activités

L'interface de gestion des activités permet, de façon intuitive, de visualiser les activités par axe, par zone, ou par objet connecté.

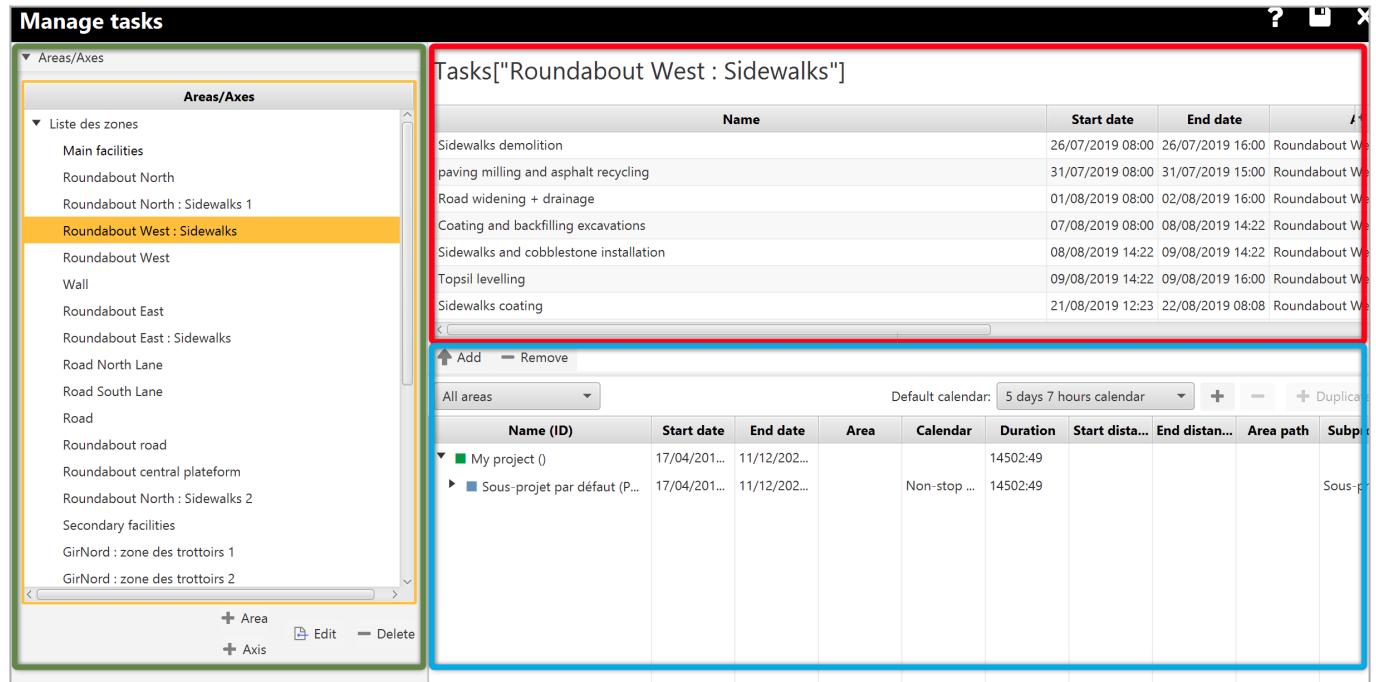

The screenshot shows the 'Manage tasks' interface. On the left, the 'Areas/Axes' panel displays a tree view of project areas and axes. The 'Roundabout West : Sidewalks' node is selected and highlighted in orange. On the right, the 'Tasks' list panel shows a table of tasks for the selected area. The table includes columns for Name, Start date, End date, and Duration. Below the table, there is a summary section for the selected project and a sub-project.

Name	Start date	End date	Duration
Sidewalks demolition	26/07/2019 08:00	26/07/2019 16:00	Roundabout W...
paving milling and asphalt recycling	31/07/2019 08:00	31/07/2019 15:00	Roundabout W...
Road widening + drainage	01/08/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Roundabout W...
Coating and backfilling excavations	07/08/2019 08:00	08/08/2019 14:22	Roundabout W...
Sidewalks and cobblestone installation	08/08/2019 14:22	09/08/2019 14:22	Roundabout W...
Topsil levelling	09/08/2019 14:22	09/08/2019 16:00	Roundabout W...
Sidewalks coating	21/08/2019 12:23	22/08/2019 08:08	Roundabout W...

Name (ID)	Start date	End date	Area	Calendar	Duration	Start dista...	End distan...	Area path	Sub...
My project ()	17/04/201...	11/12/202...			14502:49				Sous-...
Sous-projet par défaut (P...	17/04/201...	11/12/202...		Non-stop ...	14502:49				

- La navigation s'opère, comme souvent, par le biais du panneau latéral de gauche.
- Le demi-panneau inférieur droit liste quant à lui, toutes les activités de votre projet et comprends des boutons qui permettent d'importer, ajouter, supprimer, éditer ou dupliquer les activités.
- Le demi-panneau supérieur filtre les activités selon l'axe/zone ou l'objet connecté sélectionné via le panneau latéral.

Cette interface est très pratique pour modifier les affectations d'activités.

## Association d'activités aux zones, axes et objets connectés

Pour associer des activités il convient tout d'abord de sélectionner le type d'objet Phase Manager (Zone, Axe ou Objet connecté) auquel on associera les activités. Ci-dessous à l'objet connecté "Circulation Partie Sud Phase 4" :

## Liste des activités

➤ Zones/Axes
➤ Mes Formes
<b>Nom</b>
Circulation Partie Sud Phase 4
Circulation Partie Nord Phase 5

Ensuite dans le panneau inférieur, on sélectionnera la ou les activités que l'on souhaite associer à notre objet.

Ici par exemple, on ajoutera uniquement l'activité récapitulative 'Phase 4 : Chaussée Nord' (car notre objet doit s'afficher toute la durée de la phase 4) avant de cliquer sur le bouton  :

## Liste des activités

➤ Zones/Axes	Activités["Circulation Partie Sud Phase 4"]																																				
➤ Mes Formes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom</th> <th>Début</th> <th>Fin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Phase 4 : Chaussée Nord</td> <td>20/09/2019 08:00</td> <td>21/11/2019 15:00</td> </tr> </tbody> </table>	Nom	Début	Fin	Phase 4 : Chaussée Nord	20/09/2019 08:00	21/11/2019 15:00																														
Nom	Début	Fin																																			
Phase 4 : Chaussée Nord	20/09/2019 08:00	21/11/2019 15:00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Circulation Partie Sud Phase 4</td> </tr> <tr> <td>Circulation Partie Nord Phase 5</td> </tr> </tbody> </table>	Nom	Circulation Partie Sud Phase 4	Circulation Partie Nord Phase 5	 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; color: #0070C0;">↑ Ajouter</span> <span style="margin-left: 10px;">— Enlever</span> </div>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom (ID)</th> <th>Début</th> <th>Fin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mon projet (0)</td> <td>17/04/2019 08:00</td> <td>21/02/2020 15:00</td> </tr> <tr> <td>    Sous-projet par défaut (PM-00001) - Défaut</td> <td>17/04/2019 08:00</td> <td>21/02/2020 15:00</td> </tr> <tr> <td>    Phase 1 : Giratoire Nord (1)</td> <td>17/04/2019 08:00</td> <td>21/06/2019 16:00</td> </tr> <tr> <td>    Phase 2 : 1/4 Giratoire Est (2)</td> <td>26/06/2019 08:00</td> <td>23/07/2019 16:00</td> </tr> <tr> <td>    Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest (3)</td> <td>24/07/2019 08:00</td> <td>06/09/2019 16:00</td> </tr> <tr> <td>    Phase 3b : Aménagement du TPC (31)</td> <td>26/08/2019 08:00</td> <td>30/08/2019 16:00</td> </tr> <tr> <td>    Phase 4 : Chaussée Nord (4)</td> <td>20/09/2019 08:00</td> <td>21/11/2019 15:00</td> </tr> <tr> <td>        Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel jour) (3105)</td> <td>15/11/2019 08:00</td> <td>20/11/2019 15:00</td> </tr> <tr> <td>        Démolition bordures et pavés (3133)</td> <td>23/09/2019 08:00</td> <td>25/09/2019 15:00</td> </tr> <tr> <td>        Elargissement chaussée + fouilles + canalisations (3161)</td> <td>25/09/2019 08:00</td> <td>24/10/2019 15:00</td> </tr> </tbody> </table>	Nom (ID)	Début	Fin	Mon projet (0)	17/04/2019 08:00	21/02/2020 15:00	Sous-projet par défaut (PM-00001) - Défaut	17/04/2019 08:00	21/02/2020 15:00	Phase 1 : Giratoire Nord (1)	17/04/2019 08:00	21/06/2019 16:00	Phase 2 : 1/4 Giratoire Est (2)	26/06/2019 08:00	23/07/2019 16:00	Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest (3)	24/07/2019 08:00	06/09/2019 16:00	Phase 3b : Aménagement du TPC (31)	26/08/2019 08:00	30/08/2019 16:00	Phase 4 : Chaussée Nord (4)	20/09/2019 08:00	21/11/2019 15:00	Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel jour) (3105)	15/11/2019 08:00	20/11/2019 15:00	Démolition bordures et pavés (3133)	23/09/2019 08:00	25/09/2019 15:00	Elargissement chaussée + fouilles + canalisations (3161)	25/09/2019 08:00	24/10/2019 15:00
Nom																																					
Circulation Partie Sud Phase 4																																					
Circulation Partie Nord Phase 5																																					
Nom (ID)	Début	Fin																																			
Mon projet (0)	17/04/2019 08:00	21/02/2020 15:00																																			
Sous-projet par défaut (PM-00001) - Défaut	17/04/2019 08:00	21/02/2020 15:00																																			
Phase 1 : Giratoire Nord (1)	17/04/2019 08:00	21/06/2019 16:00																																			
Phase 2 : 1/4 Giratoire Est (2)	26/06/2019 08:00	23/07/2019 16:00																																			
Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest (3)	24/07/2019 08:00	06/09/2019 16:00																																			
Phase 3b : Aménagement du TPC (31)	26/08/2019 08:00	30/08/2019 16:00																																			
Phase 4 : Chaussée Nord (4)	20/09/2019 08:00	21/11/2019 15:00																																			
Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel jour) (3105)	15/11/2019 08:00	20/11/2019 15:00																																			
Démolition bordures et pavés (3133)	23/09/2019 08:00	25/09/2019 15:00																																			
Elargissement chaussée + fouilles + canalisations (3161)	25/09/2019 08:00	24/10/2019 15:00																																			
